

國立苗栗高級農工職業學校

113 學年度各處室環安衛訪視簽到表

日期：114 年 1 月 21 日(星期二)

會議地點：行政大樓三樓會議室

單 位	姓 名	簽 名
校 長 室	張校長世波	
國立聯合大學	陳睿箴管理師	陳睿箴
校 長 室	謝文斌秘書	
教 務 處	林孟郁主任	陳俊凱代
學 務 處	林俊德主任	林杏桐代
總 務 處	陳文祥主任	陳文祥
實 習 處	鄭安邦主任	陳保生代
輔 導 處	江宜芬主任	林麗芳代
圖 書 館	黃釗洪主任	黃釗洪
人 事 室	王麗英主任	王麗英
主 計 室	施宜初主任	施宜初
健 康 中 心	謝啟彬護理師	
學 務 處	楊得明老師	楊得明
庶務組	羅乃敏	羅乃敏
實習處	蔣智宇	蔣智宇

國立苗栗高級農工職業學校

113 學年度各處室環安衛訪視紀錄表

日期：114 年 1 月 21 日(星期二)

記錄人員：楊得明

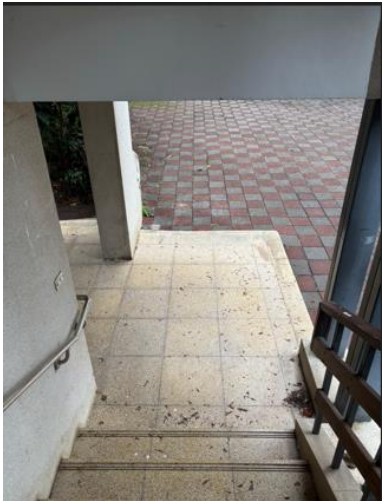
項目	位 置	建議改善位置	缺失與建議
1	行政大樓 所有 辦公室		插座初步檢測無接地極 建議全面檢測後 補設接地線， 用電設備並妥為接地 避免感電
2	行政大樓 所有 辦公室		原水冷式冷氣機分電盤 無中隔板 建議先確認控制箱是否還有 功能 再檢討加裝中隔板或是廢除
3	校區內		確認校區內所有飲水機 插座有確實接妥 外殼有確實接地 並加裝漏電斷路器

3	教務處 影印室		分電盤無中隔板 建議加裝
4	教務處 影印室		插座凹陷 建議更換
5	教務處 影印室		插座接地極已折斷 建議修復妥為接地 並確認所有插座附接地線
6	總務處		分電盤無中隔板 建議加裝

7	總務處		分電盤前方有障礙物 影響開啟 建議移開櫃子
8	總務處 文書組		地板上之延長線未固定 有絆倒之虞 建議妥善固定
9	總務處 文書組		導線妥為收納並加裝護板 避免導線磨損或人員絆倒
10	森林科 標本園		固定噴水設備的鋼筋 要加裝護帽 避免人員跌倒時有穿刺危險

11	綜合教學大樓 各樓層 飲水機		確認插座有確實接妥 外殼有確實接地 並加裝漏電斷路器
12	學務處 影印機		電源線妥為固定 並確認加裝接地極 用電設備確實接地
13	輔導處		電線避免放置於人員動線上 建議妥善固定
14	圖書館		電線避免放置於人員動線上 建議妥善固定

15	圖書館		插座初步檢測無接地極 建議全面檢測後 補設接地線， 用電設備確實接地 避免感電
16	圖書館 二樓書庫		線路與開關箱散落 建議妥為固定
17	圖書館 二樓書庫		開關箱老舊 建議更換或移除 以免人員觸電
18	健康中心		插座初步檢測無接地極 建議全面檢測後 補設接地線， 用電設備確實接地避免感電

19	教學區 各樓層 飲水機		確認插座有確實接妥 外殼有確實接地 並加裝漏電斷路器
20	加工科 後方車 棚		屋簷處加裝防撞條 避免人員或物品撞傷
21	工科實 習大樓 實習處 旁樓梯 下樓處		樓梯與梁柱距離較近 建議加裝防撞條或警語 避免人員或物品撞傷
